Sprint Planning nº6

- Lista de verificação de planejamento do sprint
- Sprint team members
- Itens da reunião de planejamento do sprint
 - Pauta
 - Resumo do sprint anterior
 - Para saber mais
 - Monitoramento da velocidade
 - Planejamento da capacidade
 - Possíveis riscos
- Recursos de planejamento do sprint
 - Quadros e retrospectivas de sprint
- Lista de verificação de planejamento do sprint

Preparação	Reunião	Acompanhamento
Sprint nº 5 fechado. Reunir feedback do PO para planeamento do Sprint 6.	 Mudanças nas atribuições de tarefas referentes ao sprint anterior. Mudanças de tarefas e prioridades. 	

Sprint team members

Nome	Função
@ Rafael Costa Magalhães	Scrum Master
@ Ricardo André Soares Rocheta	Desenvolvedor
@ Sandro Dias Da Silva	Desenvolvedor
@ Pedro Filipe Cortinhas Arruela	Desenvolvedor

Itens da reunião de planejamento do sprint

Criar Quartos @ Rafael Costa Magalhães Tempo est: 3h;

Criar Tipos de quarto @ Rafael Costa Magalhães Tempo est: 3h;

Criar Serviços @ Ricardo André Soares Rocheta Tempo est: 4h;

Criar função desencriptar @ Sandro Dias Da Silva Tempo est: 4h;

Criar Cartão @ Pedro Filipe Cortinhas Arruela Tempo est 4h;

Pauta

Durante a sprint planning, a equipa decidiu fazer um sprint mais pequeno, focado nas finalização de tarefas prioritárias e correções de erros.

- 1. Terminar Story Points do Sprint passado.
- 2. Dar prioridade aos Story Points que são dependentes das funções do sprint anterior.


Resumo do sprint anterior

Tema do sprint	Reserva, Quarto, Cartão e correções necessárias
Pontos da história	
Resumo	Criação de clientes terminada, melhoria da criação de colaboradores, ajustes na BD a nível de tabelas para criar Produtos e Stock com quantidades e leitura XML melhorada para essas alterações na BD.

Para saber mais

Data de início	23 de nov de 2022
Data de término	29 de nov de 2022
Tema do sprint	Sprint 6 - Quartos, Cartão e Correções

Monitoramento da velocidade

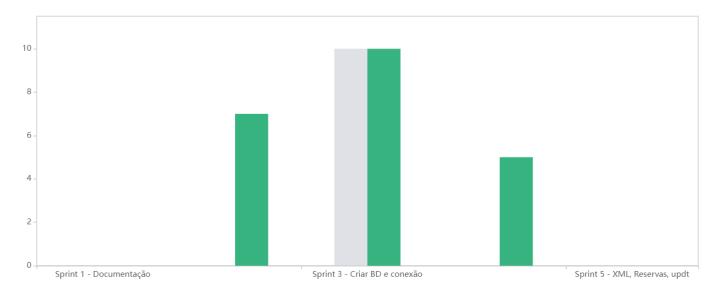

Planejamento da capacidade

	Sprint atual	Sprint anterior
Total de dias	7 dias	7 dias
Capacidade prevista	100%	100%
Capacidade da equipe	16 pontos	32 pontos
Capacidade individual	@ Ricardo André Soares Rocheta	@ Ricardo André Soares Rocheta
	4 pontos	8 pontos
	@ Sandro Dias Da Silva	@ Sandro Dias Da Silva
	4 pontos	8 pontos
	@ Rafael Costa Magalhães	@ Rafael Costa Magalhães
	4 pontos	8 pontos
	@ Pedro Filipe Cortinhas Arruela	@ Pedro Filipe Cortinhas Arruela
	4 pontos	8 pontos

Possíveis riscos

Risco		Risco	
-------	--	-------	--

Pedro Filipe Cortinhas Arruela dar merge e testar no dia da sprint review, atrasando assim a apresentação e correndo riscos desnecessários.

Começar as tarefas com mais antecedência.

ERecursos de planejamento do sprint

Quadros e retrospectivas de sprint

