

Sprint Planning nº8

- [Lista de verificação de planejamento do sprint](#)
- [Membros da equipe do sprint](#)
- [Itens da reunião de planejamento do sprint](#)
 - [Pauta](#)
 - [Resumo do sprint anterior](#)
 - [Para saber mais](#)
 - [Monitoramento da velocidade](#)
 - [Planejamento da capacidade](#)
- [Recursos de planejamento do sprint](#)

✓ Lista de verificação de planejamento do sprint

Preparação	Reunião	Acompanhamento
<input checked="" type="checkbox"/> Terminar tarefas pendentes do sprint anterior.	<input checked="" type="checkbox"/> Definir próximos passos de acordo com o feedback do cliente.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

👥 Membros da equipe do sprint

Nome	Função
@ Ricardo André Soares Rocheta	Scrum Master
@ Rafael Costa Magalhães	Desenvolvedor
@ Pedro Filipe Cortinhas Arruela	Desenvolvedor
@ Sandro Dias Da Silva	Desenvolvedor

✏ Itens da reunião de planejamento do sprint

Após a reunião e apresentação do projeto ao cliente, foi sugerida a reformulação de sistema para o design MVC como mudança prioritária. Outras alterações foram sugeridas como visualização do estado da reserva, término da reserva, entre outros. Durante este sprint, iremos focar energias em corrigir erros e problemas antes de começarmos a implementar funções novas.

Pauta

@ Ricardo André Soares Rocheta e @ Rafael Costa Magalhães reestruturação do projeto para cumprimento do MVC.

@ Pedro Filipe Cortinhas Arruela e @ Sandro Dias Da Silva terminar tarefas pendentes do sprint anterior.

@ Pedro Filipe Cortinhas Arruela fazer hotfixes entre outras validações pendentes do sprint anterior.


Resumo do sprint anterior

Tema do sprint	Sprint 7 - Reservas e Quartos
Pontos da história	<ul style="list-style-type: none">• “Eu gestor/funcionário quero ter verificações para inserir os dados corretamente”, falta terminar.• “Eu cliente quero ter serviços de localização para picar cartão”, falta terminar.
Resumo	Faltaram terminar essas implementações.

Para saber mais

Data de início	7 de dez de 2022
Data de término	13 de dez de 2022
Tema do sprint	Hotfixes e reestrutura MVC

Monitoramento da velocidade

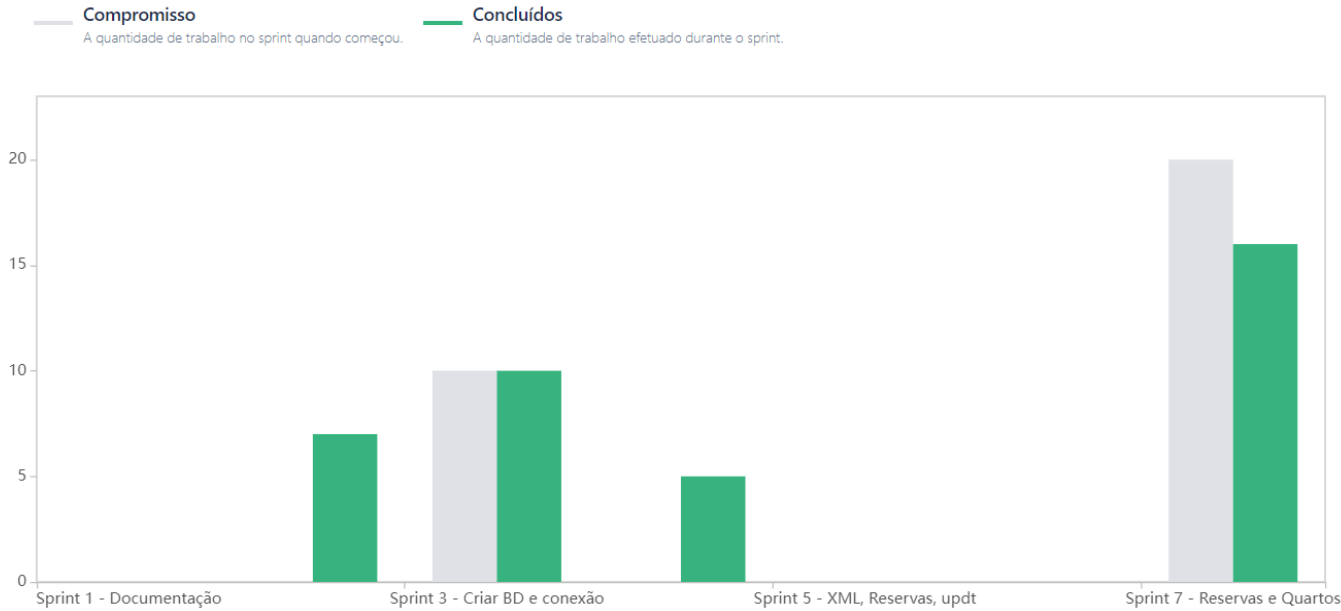

Planejamento da capacidade

	Sprint atual	Sprint anterior
Total de dias	7 dias	7 dias
Capacidade da equipe	90%	100%
Capacidade prevista	18 pontos	20 pontos
Capacidade individual	@ Sandro Dias Da Silva 3 pontos @ Ricardo André Soares Rocheta 5 pontos @ Rafael Costa Magalhães 5 pontos @ Pedro Filipe Cortinhas Arruela 5 ponto	@ Sandro Dias Da Silva 6 pontos @ Ricardo André Soares Rocheta 6 pontos @ Rafael Costa Magalhães 7 pontos @ Pedro Filipe Cortinhas Arruela 1 ponto

 Recursos de planejamento do sprint

